



Instructie planningstool digitalisering AV-objecten

Instructie bij het gebruik van de planningstool voor het opmaken van de planning van een digitaliseringsproject voor AudioVisuele objecten (beeld en geluid).

- Het **sjabloon** kan je openen en bewerken met het programma OpenProj, een gratis open source programma, zie <http://openproj.org/openproj>.
- Starten: verander de **startdatum** in de voorziene startdatum voor het te plannen digitaliseringsproject. De andere datums worden automatisch mee aangepast.
- Maak een inschatting van de **dagen** die nodig zullen zijn voor de opgesomde activiteiten en pas deze aan in het sjabloon. Activiteiten die niet relevant zijn voor het project kan je verwijderen of op 0 dagen zetten.
- De activiteiten zijn ingepland volgens het principe "Zo snel mogelijk". Je kan dit wijzigen via de "taakinformatie" (zie menu "Project" > "Taak/Bron Informatie ..."), zie tabbladen "gevorderd" en "algemeen".
- Een aantal activiteiten kunnen maar starten zodra een andere activiteit is afgerond. Deze activiteit zijn met elkaar gelinkt. Hou er indien je activiteiten verwijderd rekening mee dat sommige met elkaar gelinkt zijn en dat je mogelijk een nieuwe link moet leggen.

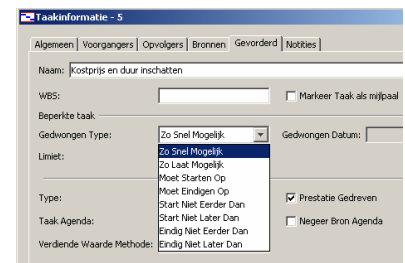

12	Licenties in orde brengen	2 dagen	31/05/11 8:00	1/06/11 17:00	11
13	<input checked="" type="checkbox"/> Selectie te digitaliseren materiaal	14 dagen	23/05/11 8:00	9/06/11 17:00	1
14	Afstemmen t.o.v. projectdoelstellingen	2 dagen	23/05/11 8:00	24/05/11 17:00	
15	Afstemmen t.o.v. financieel kader	2 dagen	25/05/11 8:00	26/05/11 17:00	14
16	Selectiecriteria vastleggen	5 dagen	27/05/11 8:00	2/06/11 17:00	15
17	Selectie bepalen	5 dagen	3/06/11 8:00	9/06/11 17:00	16
18	<input checked="" type="checkbox"/> Analyse te digitaliseren materiaal	10 dagen	10/06/11 8:00	23/06/11 17:00	13
19	Controle behuizing	5 dagen	10/06/11 8:00	16/06/11 17:00	



- Een aantal activiteiten kunnen gelijktijdig lopen. Hun timing loopt in het sjabloon daarom gelijk. Indien je niet wenst dat ze gelijk lopen kan je manueel start- en/of einddatums wijzigen. Wil je dat iets maar start nadat een andere activiteit is afgelopen dan link je beide aan elkaar

17	Selectie bepalen	5 dagen	3/06/11 8:00	9/06/11 17:00	16
18	<input checked="" type="checkbox"/> Analyse te digitaliseren materiaal	10 dagen	10/06/11 8:00	23/06/11 17:00	13
19	Controle behuizing	5 dagen	10/06/11 8:00	16/06/11 17:00	
20	Controle geur	5 dagen	10/06/11 8:00	16/06/11 17:00	
21	Controle materiële staat	5 dagen	10/06/11 8:00	16/06/11 17:00	
22	Identificatie drager en formaat	5 dagen	10/06/11 8:00	16/06/11 17:00	
23	Controle opgeslagen informatie	5 dagen	17/06/11 8:00	23/06/11 17:00	22
24	Inspectierapport opstellen	10 dagen	10/06/11 8:00	23/06/11 17:00	
25	<input checked="" type="checkbox"/> Voorbereiding materiaal	10 dagen	10/06/11 8:00	23/06/11 17:00	13
26	Laden van voorwerpen	2 dagen	10/06/11 8:00	12/06/11 17:00	

